



Assemblée générale de CLI

CNPE de ST ALBAN

26/05/2025




CNPE de SAINT-ALBAN
IMPULSION
2026



Actualités du site

- Production au 25/05 > **4,96 TWh**
- Point sur les chantiers immobiliers (préparation VD4):
 - Centre crise local : Génie civil terminé – aménagements intérieurs en cours
 - Aire RGV : Fin de la construction des bâtiments
 - Bâtiment Forez : Aménagements intérieurs en cours
- Forte modulation depuis le début de l'année (ex : unité n°2)

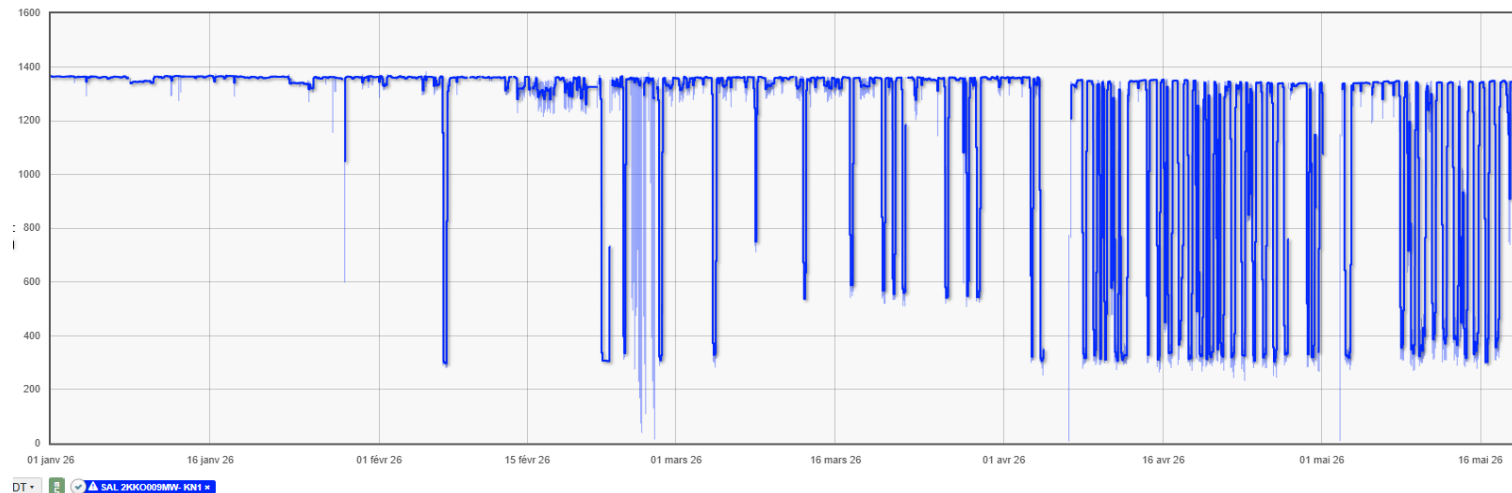





Visite partielle 2026

Unité de production n°1

97 jours
durée
planifiée

- Découplage : **23 février 2026 à 23h**
- Recouplage : **imminent** (attendu initialement pour le 4 juin)
- **15 000 activités** de maintenance
- **2 500 personnes** mobilisées
- **Travaux planifiés :**
 - Visite corps Basse pression N°3
 - Remplacement dispositif anti-battement sur pompe primaire et sur les générateurs de vapeur (avec dispositif inédit : le BMA – Bras de Manutention Autonome)
 - Chantier Frasil – connexion voie B
 - Epreuves hydrauliques de circuits

Le chantier en images

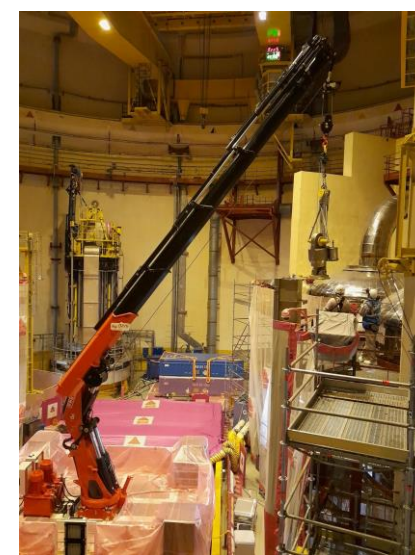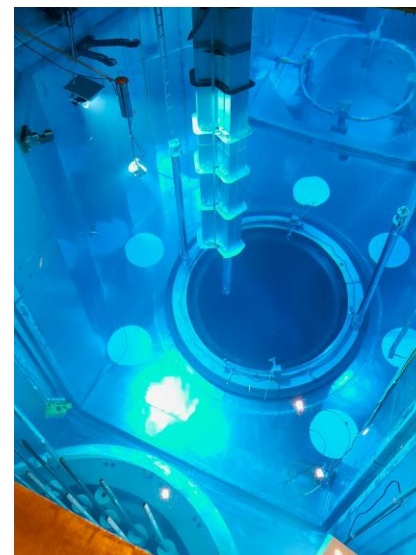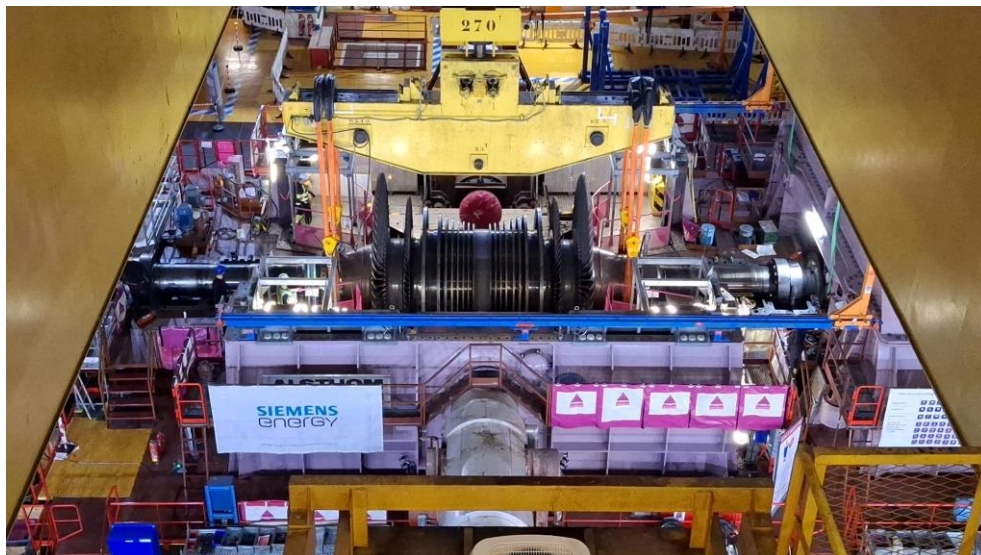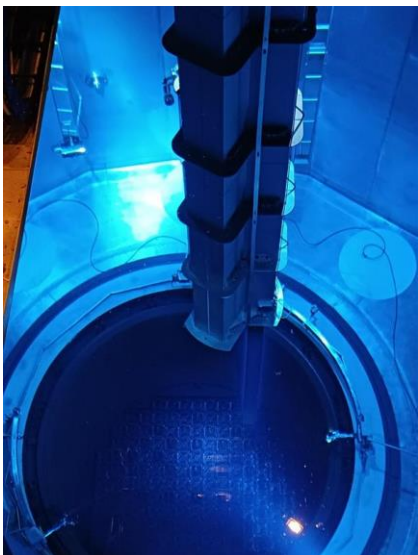

Visite partielle 2026

Bilan détaillé (au 22 mai 2026)

Sécurité

- 0 accident grave
- 1 Accident avec arrêt
- 3 Accidents sans arrêt

Radioprotection

- 1 Événement Significatif Radioprotection
- Dosimétrie respectée : 723 H.mSv (pour 883mSv max)

Environnement / Transport

- 0 Événement Significatif Environnement
- 0 Événement Significatif Transport

Sûreté

- 0 Arrêt Automatique Réacteur
- 2 Événements significatifs Sûreté


Incendie

- 0 Départ de feu
- 0 Incendie



Programme industriel 2026-2029

2027-2029 : calendrier industriel chargé sur le CNPE de Saint Alban – Saint Maurice

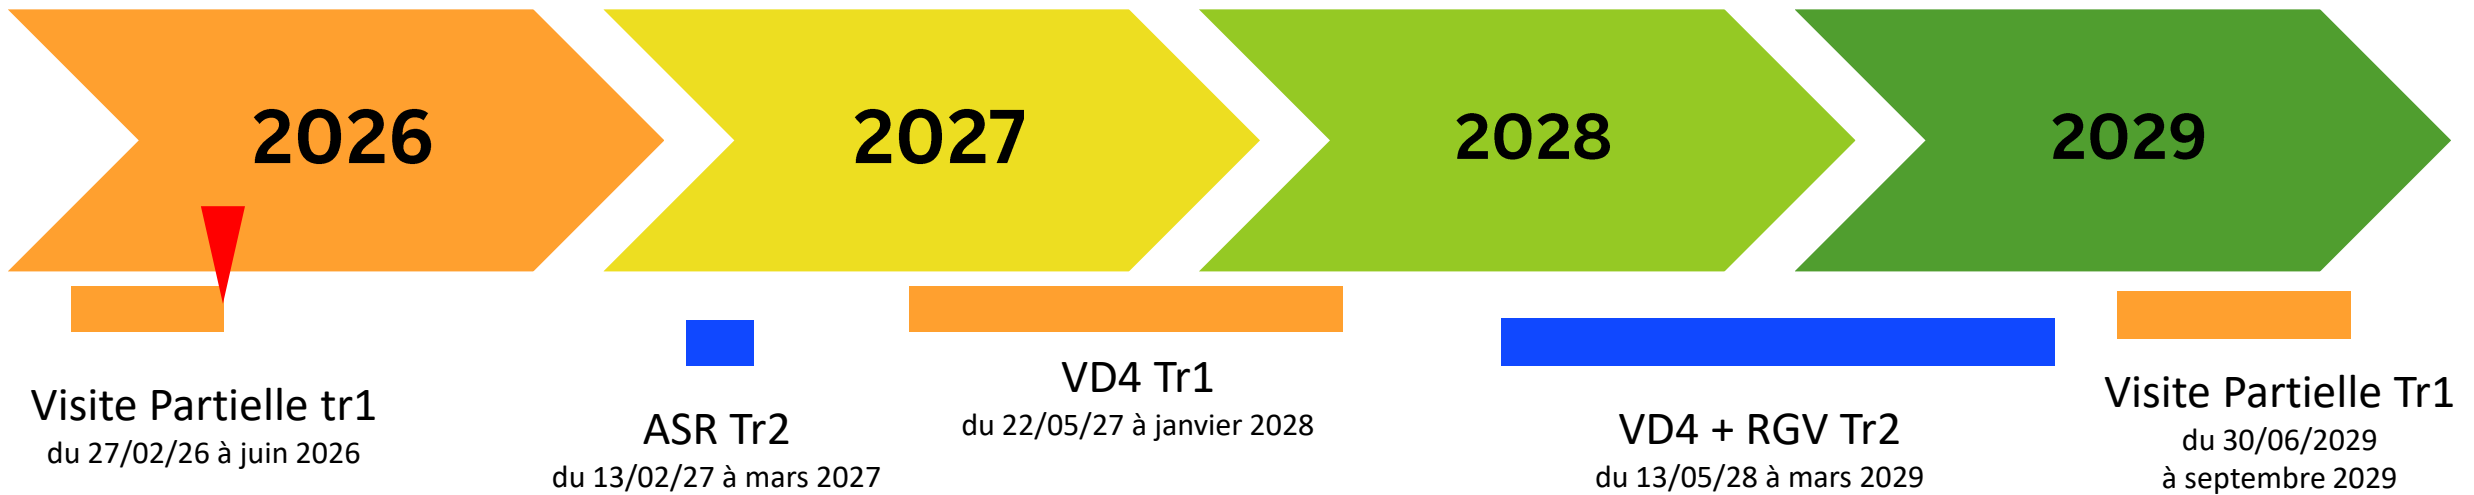



Merci pour
votre
attention



Engagés pour l'avenir
CNPE de Saint-Alban
