

Personnes présentes :

- Gérard MARCALBERT, conseiller délégué à

TRAVAUX DE REFECTION DE LA VOIRIE DANS L'ALLEE DES MENHIRS ET DE L'AVENUE d'ARVOR

Les travaux de réfection de l'allée des Menhirs et de l'avenue Arvor, qui ont débuté le 1er Septembre 2016, devaient s'achever au 29 octobre 2016. Cependant, la vétusté des réseaux souterrains a retardé l'achèvement du chantier qui est reporté au 30 novembre 2016.

Un réseau ancien

Les réseaux de gaz et d'eau sont très anciens sur ce secteur. Ce paramètre a généré quelques découvertes qui ont retardé le chantier.

Des difficultés importantes sur le réseau gaz

Pour le gaz deux réseaux sont installés. Un seul devait être en fonctionnement selon les plans fournis par l'entreprise en charge de ces réseaux. Or, lors des travaux, les ouvriers ont découvert que le second réseau, supposé inactif, était toujours sous pression. Aussi, le gestionnaire des réseaux de gaz a dû intervenir, retardant ainsi le chantier.

Les ouvriers ont, par ailleurs, découvert que les deux réseaux existants traversaient le réseau d'eau pluvial. Il a donc fallu les dérouter afin de rétablir le bon fonctionnement de ce réseau, nécessitant là encore l'intervention de l'entreprise.

Enfin, sous le trottoir, un ancien poste de détente de gaz a été découvert. Bien qu'inactif, il a dû être détruit, ce qui n'était pas initialement prévu.

Un réseau d'eau vétuste


Les anciens branchements d'adduction d'eau potable doivent être remplacés car vétustes. Lors de la manœuvre de coupure d'eau nécessaire à cette opération, la vanne a cassé. Elle a donc dû être remplacée.

Quant à l'assainissement, les regards ont été coulés à l'époque en monobloc. L'entreprise en charge des travaux les a tous reconstruit en lieu et place de la remise à niveau prévue.

Ces nombreuses surprises et déconvenues, non prévisibles en l'absence de plans fiables transmis par les gestionnaires, ont donc entraînés un retard important du chantier. Les dispositions relatives aux circulations et collecte des ordures ménagères se poursuivent.

Durant le chantier les circulations sont modifiées et les points de collecte de vos ordures ménagères déplacés.

Travaux allée des Menhirs : semaines 43 à 48

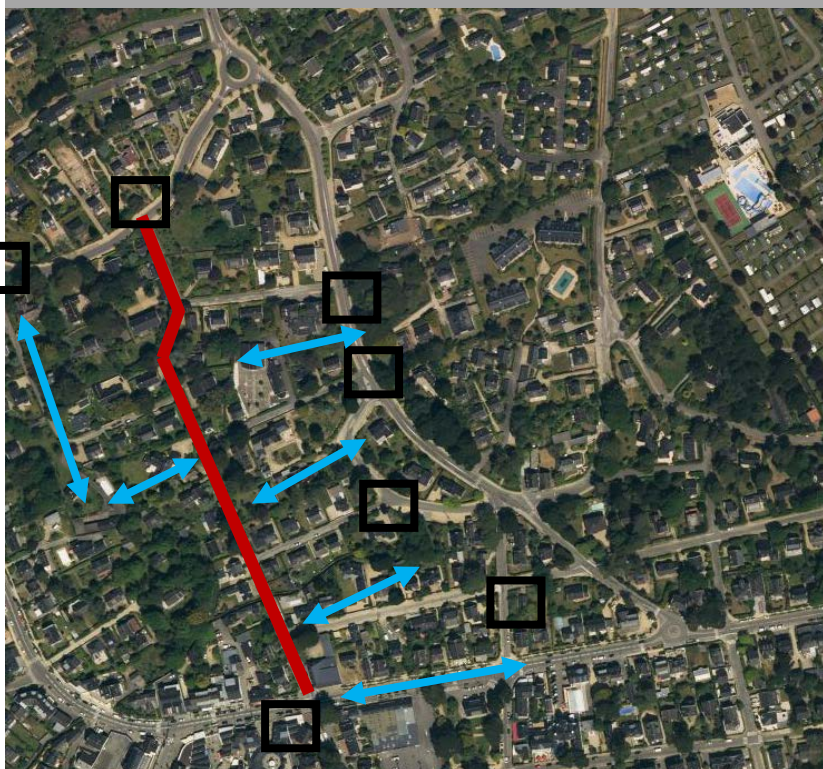

♦ Circulation des véhicules interdite sauf le weekend pour les riverains (**partie rouge**).

♦ Emplacement des conteneurs O.M., sacs jaunes 

Merci de bien vouloir placer les poubelles pour le ramassage des **lundis** à l'angle :

- ✓ Avenue du Palud/Allée des Genêts,
- ✓ Avenue du Palud/Allée des Menhirs,
- ✓ Avenue de Kerlois/Allée de Cornouaille,
- ✓ Avenue de Kerlois/Allée des Saules,
- ✓ Allée des Peupliers/Allée des Pins,
- ✓ Allée des Alignements/Avenue d'Arvor,
- ✓ Avenue des Druides/Allée des Menhirs,

La commune remercie les riverains et les usagers pour leur compréhension et leur contribution au bon déroulement des travaux.
